

平成23年度 宮崎県優良工事表彰

受賞工事紹介

(知事賞・部長賞・発注機関長賞)

平成23年8月

宮崎県環境森林部・農政水産部・県土整備部

目次

1	宮崎県知事賞（3件）	・ ・ ・ ・ ・	1
2	環境森林部長賞（1件）	・ ・ ・ ・ ・	4
3	農政水産部長賞（2件）	・ ・ ・ ・ ・	5
4	県土整備部長賞（5件）	・ ・ ・ ・ ・	6
5	発注機関長賞（62件）	・ ・ ・ ・ ・	9

知事賞（環境森林部）

工 事 名：平成21年度森林保全林道整備事業（居住）
竹の原・諸和久線（4工区）

施 工 者：木田建設 株式会社

工事概要：延長 L=180m 幅員 W=5m
土工 切土 V=1,960m³ 盛土 V=2,199m³
擁壁工 L型擁壁 L=26.0m
重力式擁壁 V=93.8m³ ほか

発注者：西臼杵支庁



【取組の概要】

本工事は、森林の急峻な断崖が連続する厳しい現場条件のもと、仮設の落石防止ネットや歩道を設置するとともに、外部機関に現場の安全パトロールの一部を委託するなど現場作業員の安全確保に積極的に取り組んだ林道開設工事です。

また、地域住民の生活に配慮し、地域住民への事前説明や、濁水対策、隣接する林道の安全通行対策などを積極的に行いました。

これらの取組は、その工夫や努力が極めて顕著であり、地域住民からも大いに喜ばれました。

知事賞（農政水産部）

工 事 名：平成21年度一般広域第2-1-6号
川南漁港 防砂堤ケーソン製作工事

施 工 者：大和開発 株式会社

工事概要：川南漁港防砂堤
ケーソン製作工
N=4函（616t／函）

発 注 者：中部港湾事務所



【取組の概要】

本工事は川南漁港の防砂堤本体に用いるケーソンを製作したものです。

施工管理においては、コンクリート打設時に、ケーソン隔壁の幅が狭く、通常のトレミー管では、打設高が高くなり、そのまま打設すると材料分離を起こす恐れがあったため、トレミー管を独自に製作しコンクリート打設を行い、狭小部のコンクリート充填も確実に進めるようにしました。

また、コンクリート養生時には、躯体を養生シートで覆う通常の養生に加え、さらにコンクリートが直接風雨にさらされないよう、その外側からブルーシートで保護して養生を行い乾燥を防ぎ、高品質のコンクリートを製作しました。

現場は、宮崎港において船舶往来が激しい場所でしたが、多くの関係者（漁協、海運会社等）と入念な調整に努め、事故・トラブルもなく円滑かつ安全に工事を完成させました。

知事賞（県土整備部）

工 事 名：平成22年度22道路災第2-2号
 鵜戸神宮線 22年発生道路災害復旧工事

施 工 者：弓原建設 株式会社

工事概要：復旧延長 L = 58.0m
 幅 員 W = 8.2m
 切土工 V = 2,134m³
 現場吹付法砕工 A = 2,100m²
 落石防止柵工 L = 14.4m ほか

発 注 者：日南土木事務所



【取組の概要】

平成22年4月の豪雨により道路法面が崩壊し、この道路から鵜戸神宮への交通ができなくなりましたが、正月迄に復旧を完了させるため、様々な対応や連携により、十分な品質と共に工期短縮を達成しました。

施工に当たっては、周辺環境対策にも十分な配慮を行い、特に、海への濁水流出を防止する工夫を行った他、地元の不安解消のため、完成時期の事前公表や住宅地を避けた運搬ルートの設定など、細かな配慮が行われました。

また、更なる品質向上を図るため、施工方法や材料の配合などに独自の工夫を実施しました。

工期に制約がある中、周辺環境や地元住民に対する細やかな配慮や、品質向上への積極的な取り組みにより質の高い工事が行われました。

環境森林部長賞

① 工事名：平成21年度林地荒廃防止施設災害復旧事業 広瀬川No.1地区

施工者：株式会社 宮本組

工事概要：防潮護岸工 L=50m
消波工（異形ブロック） 141個
天端被覆工 L=50m ほか

発注者：中部農林振興局

【取組の概要】

本工事は、海岸部の厳しい現場条件のもと、波高観測データ等により作業の安全を確認した上で施工を行うとともに、現場作業員の健康管理や熱中症対策に積極的に取り組んだ治山工事です。また、統括安全衛生管理義務者として、労働災害防止のための調整はもとより、周辺住民など関係者との調整を積極的に行いました。

これらの取組は、その工夫や努力が極めて顕著であり、地域住民からも大いに喜ばれました。



農政水産部長賞

① 工 事 名：平成21年度畑地帯総合整備事業（担手支援）
尾八重野地区8工区

施 工 者：原工業 株式会社

工事概要：整地工 A = 5.9ha
道路工 L = 250.5m
排水路工 L = 1,129.9m

発 注 者：西諸県農林振興局

【取組の概要】



本工事は、畑のほ場整備（区画整理）を行ったものです。工事着手後の地元からの表土確保に関する要望にも素早く施工計画を見直し、作業工程を工夫し、工事を完成させました。

工事着手前、完成写真に航空写真を活用する等、施工管理にも工夫を行いました。

個人財産である農地を扱う為、地元調整に多大な労力や時間を要するほ場整備工事においてこのような取り組みは、高い評価を受けました。

② 工 事 名：平成21年度かんがい排水事業（一般）
岩熊地区2工区

施 工 者：有限会社 松本建設

工事概要：用水路工 L = 78.1m

発 注 者：東臼杵農林振興局

【取組の概要】



本工事は、用水路（水路トンネル）の改修を行ったものです。

住宅地が隣接し、かつ幅員の狭い市道沿いの用水路であったため、資材搬入時の交通規制をなくすための工夫をする等安全対策に努めました。またモルタル充填・注入工など写真だけでは仕上りが判断しづらい部分について、施工の手順を写真等を使って分かりやすく整理する等の施工管理にも努めており、これらの取り組みが高い評価を受けました。

県土整備部長賞

- ① 工事名：平成22年度通常砂防第3-1-1号
田久保川 主堰堤工事
- 施工者：株式会社 木下組
- 工事概要：主堰堤工（非越流部）
H=8.8m L=57.5m V=813.0m³
- 発注者：西臼杵支庁（土木課）



【取組の概要】

地元に対する工事の事前周知や進捗状況の説明を丁寧に行うなど、周辺住民への細かな気配りが行き届いた現場であり、完成時には、地元から感謝の言葉を受けました。

また、作業員の安全確保を最優先するため、土石流災害を想定した避難訓練を積極的に実施するなど、工夫を凝らした取り組みが評価されました。

- ② 工事名：平成22年度第2342-イ-1号
えびの高原スポーツレクリエーション施設 製氷設備更新工事
- 施工者：江坂設備工業 株式会社
- 工事概要：屋外スケートリンク 面積2,040m²
上記レクリエーション施設にかかる製氷設備更新工事 ほか
- 発注者：営繕課



【取組の概要】

スケートリンクの製氷作業に当たっては、事前に実験を行い、最適な製氷条件を入念に確認するなど、品質向上のための努力が見られました。

また、メンテナンス面を考慮し、水抜きバルブの設置や、点検口の構造の変更を提案するなど、管理者側の立場での積極的な提案が評価されました。

県土整備部長賞

- ③ 工事名：平成21年度交付建設2-46-2号
国道219号 広瀬バイパス 道路改良工事
- 施工者：株式会社 田村産業
- 工事概要：道路土工 $V=14,829\text{m}^3$ （プレロード盛土撤去）
ボックスカルバート $L=20.0\text{m}$ （ $12.5 \times 6.6\text{m}$ ） ほか
- 発注者：宮崎土木事務所



【取組の概要】

軟弱地盤上に重量物を設置する工事であるため、地盤の沈下量管理が特に重要な工事でしたが、正確な管理が実施できるよう独自の工夫により品質の確保に務めました。

また、市道切替を1日で完了させるなど、道路利用者への影響を最小限に抑えるための配慮や、掲示板等を用いた地域住民への効果的な情報発信が評価されました。

- ④ 工事名：平成22年度県単維持第01-1-4号
宮崎須木線（大口）災害復旧工事
- 施工者：株式会社 トクホ建設
- 工事概要：崩土取除工 $V=824\text{m}^3$
仮設防護柵工 $L=59.1\text{m}$
- 発注者：高岡土木事務所



【取組の概要】

ゴールデンウィーク直前に道路交通止が発生しましたが、現場での計測や安全確保などを最大限に慎重に対応しながら、昼夜兼行での工事に取り組み、連休初日までに交通開放を達成しました。

作業状況を周辺住民等に説明するなど地域への配慮も十分に実施しながら工事を進め、工事完了後には、各方面から感謝の意が寄せられました。

県土整備部長賞

- ⑤ 工 事 名 : 平成22年度道路受託第01-3号
稲葉崎平原線 安賀多橋 地覆高欄工事(その1)
- 施 工 者 : 株式会社 伊東組
- 工事概要 : 安賀多橋
地覆・高欄工 $L = 260.6\text{m}$
歩道舗装工(特殊ブロック) $A = 827\text{m}^2$
- 発 注 者 : 延岡土木事務所



【取組の概要】

道路利用者の立場で、より使いやすい施設を提供するための積極的な提案が行われました。

15社からなる安全協議会の会長として、毎週の会議や、工程管理調整、積極的な安全指導などに中心的な役割を發揮しました。

また、部材厚の薄いコンクリート壁を施工するに当たり、ひび割れ防止など品質向上のための積極的な対応が評価されました。

発注機関長賞（環境森林部）

① 工事名：平成21年度林地荒廃防止事業
御塩井

施工者：株式会社 相生組

工事概要：斜面切取工 69.9m³
ロックボルト 18本
岩盤接着工 1.27m³

発注者：西臼杵支庁



② 工事名：平成21年度奥地保安林保全緊急対策事業
小槿地区（2工区）

施工者：内田産業 株式会社

工事概要：床固工 2基 V=685.7m³

発注者：南那珂農林振興局



③ 工事名：平成22年度復旧治山事業
椎八重（1工区）地区工事

施工者：株式会社 大建

工事概要：谷止工（副堤） 1基
V=1,097.4m³

発注者：北諸県農林振興局




④ 工事名：平成22年度復旧治山事業
後平地区

施工者：株式会社 丸山工務店

工事概要：谷止工 2基 V=699.0m³
床固工 1基 V=183.2m³

発注者：西諸県農林振興局

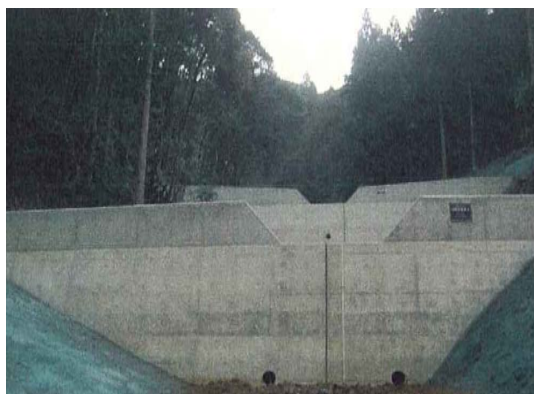

発注機関長賞（環境森林部）

⑤ 工事名：平成22年度林地荒廃防止事業
山中

施工者：有限会社 佐伯建設

工事概要：谷止工 1基 $V=384.0\text{m}^3$

発注者：児湯農林振興局



⑥ 工事名：平成21年度山のみち地域づくり交付金事業
小川・石打谷線（2-1工区）

施工者：合名会社 仁科産業

工事概要：L=279.5 W=5m

切土 $V=163\text{m}^3$

盛土 $V=4,960\text{m}^3$

補強土壁工 656.4 m^2 ほか

発注者：児湯農林振興局



⑦ 工事名：平成21年度復旧治山事業
（滝の下1工区）

施工者：株式会社 松澤組

工事概要：アンカー工 18本

排土工 1式 ほか

発注者：東臼杵農林振興局



発注機関長賞（農政水産部）

- ① 工事名：平成21年度
中山間地域総合整備事業
五ヶ所地区3工区
- 施工者：大寺建設 株式会社
- 工事概要：用水路工 L = 1397.3m
- 発注者：西臼杵支庁



- ② 工事名：平成21年度
中山間地域総合農地防災事業
東深角地区5工区
- 施工者：高千穂土木 株式会社
- 工事概要：用水路工 L = 112.1m
- 発注者：西臼杵支庁



- ③ 工事名：平成21年度基幹農道整備事業
北今泉3期地区1工区
- 施工者：富士ピー・エス・内山
特定建設工事共同企業体
- 工事概要：橋梁上部工 L = 120.7m
- 発注者：中部農林振興局



- ④ 工事名：平成22年度
経営体育成基盤整備事業
跡江2期地区4工区
- 施工者：株式会社 伸東建設
- 工事概要：整地工 A = 7.32ha
道路工 L = 1,383.8m
排水路工 L = 871.7m
- 発注者：中部農林振興局



発注機関長賞（農政水産部）

⑤ 工事名：平成22年度
農地保全整備事業（シラス）
上本城地区1工区

施工者：有限会社 大洋建設

工事概要：水兼農道 L=200.0m
集水路工 L=271.9m
承水路工 L=217.4m

発注者：南那珂農林振興局



⑥ 工事名：平成22年度
畑地帯総合整備事業（担手支援）
弘川第1-2期地区4工区

施工者：稲元建設 株式会社

工事概要：管水路工 L=1812.5m

発注者：北諸県農林振興局



⑦ 工事名：平成22年度
経営体育成基盤整備事業
中央耕地地区4工区

施工者：有限会社 別府建設

工事概要：暗渠排水工 A=5.05ha

発注者：西諸県農林振興局



⑧ 工事名：平成22年度
農地保全整備事業（特殊土壌）
下野田原2期地区2工区

施工者：株式会社 津房産業

工事概要：排水路工 L=694.0m

発注者：児湯農林振興局



発注機関長賞（農政水産部）

- ⑨ 工事名：平成21年度
畑地帯総合整備事業（担手育成）
尾鈴北第1地区 2工区
- 施工者：株式会社 宏和工業
- 工事概要：管水路工 L = 2, 4 4 1. 6 m
- 発注者：児湯農林振興局



- ⑩ 工事名：平成22年度特定漁場第4-1-0号
日向灘地区 日向灘沖合漁場
魚礁工事 4-1
- 施工者：松浦・竹井經常建設共同企業体
- 工事概要：中層型浮魚礁
製作・設置工 N = 2 基
- 発注者：漁村振興課



- ⑪ 工事名：平成21年度漁港環境第6-1-2号
油津漁港 第1突堤護岸工事
- 施工者：富岡建設 株式会社
- 工事概要：護岸工 L = 3 6. 6 m
本護岸工 L = 2 9. 7 m
- 発注者：油津港湾事務所



- ⑫ 工事名：平成22年度漁村再生第5-1-1号
南浦漁港（須美江地区）
防波堤改良工事
- 施工者：豊松建設 株式会社
- 工事概要：防波堤改良 L = 5 0. 6 m
護岸改良 L = 3 5. 9 m
- 発注者：北部港湾事務所



発注機関長賞（県土整備部）

- ① 工事名：平成22年度第1742-7-1号
水産振興協会ろ過槽改修他工事
- 施工者：有限会社 四季設備
- 工事概要：150トンろ過槽ろ材更新、槽本体補強、内外面塗装更新他一式
PSポンプ室機器設備：海水取水ポンプ更新一式 ほか
- 発注者：営繕課



- ② 工事名：平成22年度第512-7-1号
衛生環境研究所付属棟
建設主体他工事
- 施工者：株式会社 マスジュウ
- 工事概要：付属棟 鉄筋コンクリート造平屋建、延床面積271.63㎡
上記建物の建設に係る建築工事及び本館改修工事
- 発注者：営繕課



- ③ 工事名：平成22年度第1122-7-1号
日南振徳高校普通特別教室棟
建設主体工事
- 施工者：丸宮建設 株式会社
- 工事概要：鉄筋コンクリート造3階建
延床面積 2,181.60㎡
上記建物の建設に係る
建築工事一式
- 発注者：営繕課



- ④ 工事名：平成22年度第1122-7-3号
日南振徳高校普通特別教室棟
建設電気工事
- 施工者：株式会社 電工社
- 工事概要：鉄筋コンクリート造3階建、
延床面積 2,181.60㎡
上記建物の建設に係る電気工事
- 発注者：営繕課



発注機関長賞（県土整備部）

⑤ 工事名：平成21年度交付建設第2-16-1号
木脇高岡線 宮王丸工区
道路改良工事

施工者：株式会社 戸敷開発

工事概要：切土総量 $V = 8646.0\text{m}^3$
排水工 $L = 445.3\text{m}$
ボックスカルバート工
 $L = 37.4\text{m}$ ほか

発注者：宮崎土木事務所



⑥ 工事名：平成21年度特交地区第1-1-6号
県道宮崎須木線 松橋工区
歩道工事

施工者：旭洋建設 株式会社

工事概要：歩道舗装工
延長 $L = 245\text{m}$
歩道舗装工 $A = 642\text{m}^2$

発注者：宮崎土木事務所



⑦ 工事名：平成21年度県単改良
第110-21-1-01号
天神川農道橋下部工事

施工者：株式会社 岩永建設

工事概要：天神川農道橋下部工事
A1橋台 $H = 3.6\text{m}$
A2橋台 $H = 3.5\text{m}$
場所打杭 $\phi 1000$ $N = 6$ 本

発注者：宮崎土木事務所



⑧ 工事名：平成22年度通常砂防第18-3-1号
別府田野川 通常砂防事業
林道付替工事

施工者：大塚・三州経常建設共同企業体

工事概要：延長 $L = 170\text{m}$
切土工 $V = 2,389\text{m}^3$
L型擁壁設置工 $L = 106.8\text{m}$
ブロック積工 $A = 241.0\text{m}^2$

発注者：宮崎土木事務所



発注機関長賞（県土整備部）

⑨ 工事名：平成21年度交付建設第3-6-1号
一般県道 郷之原日南線
内之田工区 橋梁上下部工事

施工者：河野・谷口経常建設共同企業体

工事概要：内之田橋上下部工
橋台工（逆T式）N=2基
場所打杭 N=8本
上部工 N=1式

発注者：日南土木事務所



⑩ 工事名：平成21年度広域河川第43-3号
酒谷川 付替道路改良工事

施工者：一政建設 株式会社

工事概要：延長 L=228.6m
補強盛土工 L=172.6m
V=3, 270m³
排水工 L=236m ほか

発注者：日南土木事務所



⑪ 工事名：平成22年度22道路災第85-01号
国道448号 一の坂工区
道路災害復旧工事その1

施工者：株式会社 畑山建設

工事概要：復旧延長 L=126.0m
切土工 V=8, 385m³
植生基材吹付工
A=1, 767m² ほか

発注者：串間土木事務所



⑫ 工事名：平成22年度22道路災第86-02号
国道448号 市木工区
道路災害復旧工事

施工者：東和建設工業 株式会社

工事概要：施工延長 L=30.1m
落石防止柵 L=20.0m
増厚コンクリート N=1.0式
アンカー工 L=119.0mほか

発注者：串間土木事務所



発注機関長賞（県土整備部）

⑬ 工事名：平成21年度交付建設第3-35-02号
国道448号 上千野～代田工区
道路改良工事

施工者：株式会社 谷口組

工事概要：延長 L=264.0m
切土工 V=5,312m³
盛土工 V=2,621m³
法面工 A=947m² ほか

発注者：串間土木事務所



⑭ 工事名：平成21年度交付都市第4-8号
蔵原通線 西都城駅前広場
歩道改良工事

施工者：丸宮建設 株式会社

工事概要：天然石張歩道舗装工
A=1,178m²
アスファルト舗装工
A=1,148m² ほか

発注者：都城土木事務所



⑮ 工事名：平成22年度交付建設第31-01-5号
県道都城東環状線 今町工区
道路改良工事（梅北IC）

施工者：三原建設 株式会社

工事概要：盛土工 V=9,754m³
L型擁壁工 L=59.8m
下層路盤工 A=14,630m²
側溝工 L=322.7m ほか

発注者：都城土木事務所



⑯ 工事名：平成22年度県単補修第02-2号
国道269号 蓼池2工区
舗装修繕工事

施工者：大淀開発 株式会社

工事概要：舗装補修工 L=811.0m
路面切削工 A=6,010m²
表層工 A=6,010m²
ほか

発注者：都城土木事務所



発注機関長賞（県土整備部）

⑰ 工事名：平成21年度総流防大第7-6号
山田川 河川改修工事

施工者：有限会社 福島組

工事概要：延長 $L = 122.0\text{m}$
築堤盛土工 $V = 9,421\text{m}^3$
樋門工 $N = 1.0$ 基
ほか

発注者：都城土木事務所



⑱ 工事名：平成21年度特交地区第5-4-1号
県道御池都城線 浜之段工区
交通安全工事

施工者：株式会社 平原産業

工事概要：延長 $L = 177.0\text{m}$
掘削工 $V = 2,784\text{m}^3$
法面工 $A = 1,149\text{m}^2$
ほか

発注者：都城土木事務所



⑲ 工事名：平成21年度県単改良
第510-21-2-1号
湯の元川 可動堰下部工工事

施工者：株式会社 吉行産業

工事概要：堰本土工 $N = 1$ 基
基礎工（場所打杭 $\phi 1000$ ）
 $N = 8$ 本
護岸工 $A = 530\text{m}^2$ ほか

発注者：小林土木事務所



⑳ 工事名：平成21年度特交地区第8-3-2号
交通安全施設整備工事(地区一括)
洗出橋側道橋上下部工事

施工者：原工業 株式会社

工事概要：洗出橋側道橋上下部工
橋台工 $N = 2$ 基
場所打杭基礎 $N = 4$ 本
上部工 $N = 1$ 式

発注者：小林土木事務所



発注機関長賞（県土整備部）

⑳ 工事名：平成21年度障害防止第1-1号
障害防止対策工事

施工者：株式会社 日進建設

工事概要：川北川障害防止工事
護岸工 $A = 593 \text{ m}^2$
帯工 $N = 2$ 基
護床工 $A = 370 \text{ m}^2$

発注者：小林土木事務所



㉑ 工事名：平成22年度22道路災第212-01号
小林えびの高原牧園線 末永工区
道路災害復旧工事

施工者：有限会社 留野総建

工事概要：復旧延長 $L = 18.0 \text{ m}$
大型ブロック積工 $A = 107 \text{ m}^2$
張芝工 $A = 137.0 \text{ m}^2$
ほか

発注者：小林土木事務所



㉒ 工事名：平成21年度河川激特第2-3号
麓川 河川改修（県道市道工事）

施工者：株式会社 長友組

工事概要：延長 $L = 220 \text{ m}$
盛土工 $V = 2,105 \text{ m}^3$
排水工 $L = 412.2 \text{ m}$
舗装工 $A = 5,157 \text{ m}^2$

発注者：高岡土木事務所



㉓ 工事名：平成21年度県橋維持第82-1号
一般県道綾宮崎自転車道線
塚原橋歩道橋 橋梁維持工事

施工者：有限会社 綾川建設

工事概要：塚原橋歩道橋 維持工事
プレキャストPC版設置工
 $N = 85$ 枚
高欄・床版撤去工 $N = 1$ 式

発注者：高岡土木事務所



発注機関長賞（県土整備部）

㊦ 工事名：平成21年度連携国道 第2-1-1-4号
国道219号 横野工区 道路改良工
事

施工者：株式会社 伊達組

工事概要：延長 $L=78.6\text{m}$
補強土壁工 $A=181\text{m}^2$
切土総量 $V=7,137\text{m}^3$
地盤改良工 $L=333.4\text{m}$ ほか

発注者：西都土木事務所



㊧ 工事名：平成21年度交付建設第2-43-21号
国道219号 園元工区 改良工事

施工者：有限会社 川崎開発

工事概要：施工延長 $L=153.5\text{m}$
土工 $V=1,688\text{m}^3$
路盤工 $A=1,161\text{m}^2$
路床置換工 $A=1,172\text{m}^2$

発注者：西都土木事務所



㊨ 工事名：平成21年度交付建設第2-43-22号
国道219号 園元工区 改良工事

施工者：日栄建設 株式会社

工事概要：施工延長 $L=417.1\text{m}$
土工 $V=6,963\text{m}^3$
路盤工 $A=3,757\text{m}^2$
路床置換工 $A=3,935\text{m}^2$

発注者：西都土木事務所



㊩ 工事名：平成21年度交付建設第2-43-24号
国道219号 園元工区 舗装工事

施工者：旭洋建設 株式会社

工事概要：施工延長 $L=782.1\text{m}$
車道舗装 $A=5,298\text{m}^2$
上層路盤 $A=5,298\text{m}^2$
縁石工 $L=1,227.2\text{m}$

発注者：西都土木事務所



発注機関長賞（県土整備部）

- ⑳ 工事名：平成20年度連携特改第1-2-4-1号
国道219号片内トンネル工事
第1-2-4-1号
- 施工者：弓原・富岡・坂口特定建設工事
共同企業体
- 工事概要：延長 L=377.0m
トンネル本体工 L=377.0m
坑門工 N=2基
アンカー工 N=30本 ほか
- 発注者：西都土木事務所



- ㉑ 工事名：平成21年度交付建設第2-35-1号
主要地方道 東郷西都線
戸崎工区 橋梁工事
- 施工者：株式会社 尾鈴建設
- 工事概要：戸崎2号橋下部工
P1橋脚 H=10.5m
基礎形式 深礎杭 φ5000
L=9.5m N=1本
- 発注者：高鍋土木事務所



- ㉒ 工事名：平成21年度交付交安第2-63-01号
主要地方道 宮崎高鍋線
歩道設置工事 2-63-1
- 施工者：長嶺土木 有限会社
- 工事概要：延長 L=700m
L型擁壁工 L=170.3m
ブロック積 A=126㎡
排水工 L=470.8m ほか
- 発注者：高鍋土木事務所



- ㉓ 工事名：平成21年度交付都市第16-2号
菖蒲池上江線 平原工区
道路改良工事
- 施工者：株式会社 桑原建設
- 工事概要：延長 L=300m
路床安定処理工 A=2,827㎡
下層路盤工 A=2,610㎡
ほか
- 発注者：高鍋土木事務所



発注機関長賞（県土整備部）

㊸ 工事名：平成21年度県単特改第121-20-2号
西都南郷線道路改良工事

施工者：株式会社 南郷開発

工事概要：L=123m
ブロック積工 A=507㎡
排水工 L=116.3m
舗装工 A=146㎡ ほか

発注者：日向土木事務所



㊹ 工事名：平成22年度交付建設第1-29-1号
国道327号 日向バイパス工区
改良工事

施工者：株式会社 五大建設

工事概要：延長 L=1622.9m
カゴマット工 A=256m²
U型側溝工 L=256m
ほか

発注者：日向土木事務所



㊺ 工事名：平成20年度連携国道第7-2-4-1号
国道327号 野地トンネル工事
第7-2-4-1

施工者：フジタ・矢野・内山
特定建設工事共同企業体

工事概要：トンネル本体工
L=1,019.0m
坑門工N=2.0基

発注者：日向土木事務所



㊻ 工事名：平成21年度県単特改第121-20-3号
西都南郷線 上渡川工区
改良工事

施工者：有限会社 松田土木

工事概要：延長L=187m
Gr・L型擁壁工 L=90m
排水工 L=173.6m
下層路盤工 A=572㎡ ほか

発注者：日向土木事務所



発注機関長賞（県土整備部）

- ③⑦ 工事名：平成21年度円滑国道第7-1-1-2号
国道327号 日向バイパス工区
改良工事
- 施工者：株式会社 橋口組
- 工事概要：延長 $L=387.5\text{m}$
盛土工 $V=9,673\text{m}^3$
下層路盤工 $V=3,522\text{m}^2$
ほか
- 発注者：日向土木事務所



- ③⑧ 工事名：平成22年度道路受託第01-10号
稲葉崎平原線 安賀多橋
橋面舗装工事
- 施工者：湯川建設 株式会社
- 工事概要：安賀多橋 $L=255.0\text{m}$
舗装工 $A=3310\text{m}^2$
安全施設工 $N=1\text{式}$
- 発注者：延岡土木事務所



- ③⑨ 工事名：平成22年度交付地活第25-01号
国道388号 古江トンネル照明
設備更新工事
- 施工者：西南電気 株式会社
- 工事概要：トンネル内照明設置
基本照明 $N=34\text{基}$
入口照明 $N=34\text{基}$ ほか
- 発注者：延岡土木事務所



- ④⑩ 工事名：平成21年度県単改良
第1010-21-2-1号
妙田川 橋梁工事
- 施工者：上田工業 株式会社
- 工事概要：橋梁上下部工 $L=24.3\text{m}$
PCプレテンション方式単純T桁
橋 橋台工 $N=2\text{基}$
場所打杭基礎 $N=11\text{本}$
- 発注者：延岡土木事務所



発注機関長賞（県土整備部）

④① 工事名：平成21年度急傾対策第40-3-2号
浦尻第4地区
急傾斜地崩壊対策工事

施工者：株式会社 盛武組

工事概要：重力式擁壁工 $L = 26.8\text{m}$
($H = 4.5\text{m}$)

簡易吹付法砕工 $A = 646\text{m}^2$

現場吹付法砕工 $A = 244\text{m}^2$

発注者：延岡土木事務所



④② 工事名：平成21年度改修重要第3-1-1号
油津港 東地区 港湾工事
第3-1-1号

施工者：河野・谷口経常建設共同企業体

工事概要：防波堤 消波工 $L = 40.0\text{m}$
消波ブロック据付 $N = 322$ 個

発注者：油津港湾事務所



④③ 工事名：平成21年度改修重要第1-1-02号
細島港 外港地区 港湾工事
第1-1-02号

施工者：株式会社 長谷川組

工事概要：北沖防波堤
ケーソン製作・仮置工 $N = 1$ 函

発注者：北部港湾事務所

