


間接工事費の設計変更についての参考資料

1 積算のイメージ

最終設計変更の間接工事費（共通仮設費及び現場管理費）

※積算基準書による算出（率計上）

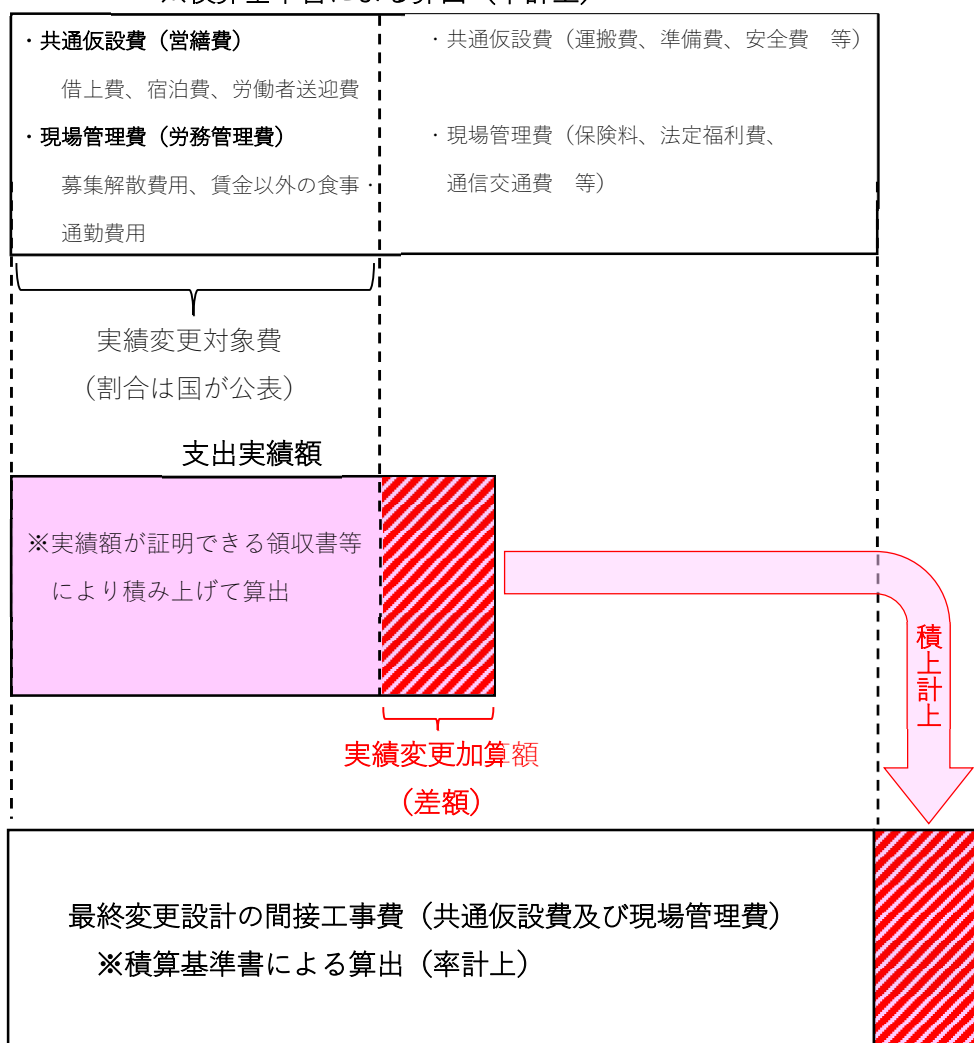

2 算出例（参考）

（1）最終変更設計額が1億円程度の道路改良工事で、地域外の労働者6人が6ヶ月間アパートを借りて働いた場合

○実績変更対象費（共通仮設費）

5,900,000 円（共通仮設費(率分)）×12.82%（実績変更対象費の割合）
= 756,380 円

○実績変更対象費（現場管理費）

19,400,000 円（現場管理費）×1.52%（実績変更対象費の割合）
= 294,880 円

実績変更対象費に関する内訳書（様式 1）

費目		費用	内容	実績額（税抜き）
共通仮設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用	1,440,000 円 ※40,000 円/月のアパートを 6 ヶ月間 6 部屋借上げた場合
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用	
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）	
	合計			1,440,000 円
現場管理費	労務管理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当	360,000 円 ※県外から高速バス利用で赴任した場合（月 1 の帰省込み）
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助、交通費の支給	72,000 円 ※自社の車 2 台を利用してアパートから現場に片道 10 km を 6 ヶ月間通勤した場合
	合計			432,000 円

○実績変更加算額（共通仮設費）

1,440,000 円（支出実績額）－ 756,380 円（実績変更対象費）
= 606,700 円（実績変更加算額として、共通仮設費に積上計上する。）

○実績変更加算額（現場管理費）

432,000 円（支出実績額）－ 294,880 円（実績変更対象費）
= 137,120 円（実績変更加算額として、現場管理費に積上計上する。）

(2) 最終変更設計額が1億円程度の河川工事で、地域外の労働者5人が2ヶ月間ホテルに宿泊して働いた場合

○実績変更対象費（共通仮設費）

4,900,000 円（共通仮設費(率分)）×9.19%（実績変更対象費の割合）
=450,310 円

○実績変更対象費（現場管理費）

18,200,000 円（現場管理費）×1.24%（実績変更対象費の割合）
=225,680 円

実績変更対象費に関する内訳書（様式1）

費目		費用	内容	実績額（税抜き）
共通仮設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用	
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用	1,000,000 円 ※5,000 円/泊のホテルに5人が40泊した場合
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）	
	合計			1,000,000 円
現場管理費	労務管理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当	100,000 円 ※県外から高速バス利用で赴任した場合（月1の帰省込み）
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助、交通費の支給	400,000 円 ※レンタカー2台を利用してホテルから現場に2ヶ月間通勤した場合
	合計			500,000 円

○実績変更加算額（共通仮設費）

1,000,000 円（支出実績額）－450,310 円（実績変更対象費）
= 549,690 円（実績変更加算額として、共通仮設費に積上計上する。）

○実績変更加算額（現場管理費）

500,000 円（支出実績額）－ 225,680 円（実績変更対象費）

= 274,320 円（実績変更加算額として、現場管理費に積上計上する。）
